

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक 9454 / क्रम-25 / 184 दिनांक 16-9-2026

सेवा में,


मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'जल जीवन मिशन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल : बाराबंकी में करोड़ों के काम में भ्रष्टाचार का आरोप, गांवों तक नहीं पहुंचा पानी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंसारा पेयजल योजना, विकास खण्ड पूरेडलई अन्तर्गत अन्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, बाउण्डीवाल-100 प्रति०, पम्प हाउस-100 प्रति० एवं 320 हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शिरोपरि जलाशय एवं ड्रेन का कार्य प्रगति पर है। कार्यस्थल पर लायी गयी निम्न स्तर की ईटो को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया है एवं मानक अनुसार उच्च स्तर की ईटो का प्रयोग किया जा रहा है। 15 दिवस के अन्दर योजना से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह जनवरी, 2027 निर्धारित है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

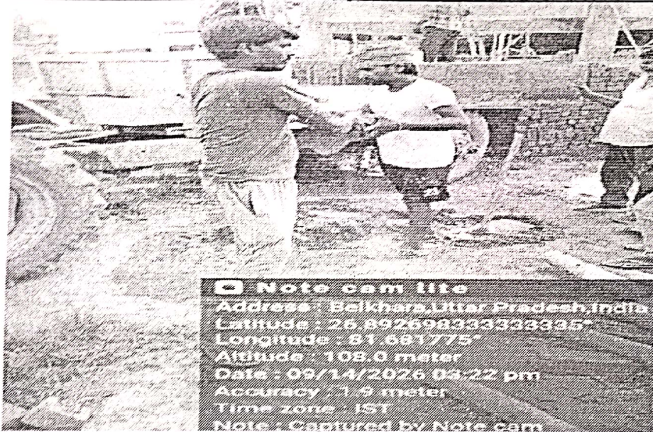

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 5- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- श्री जफर अहमद, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 9- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता
