


(फोटोग्राफ्स)

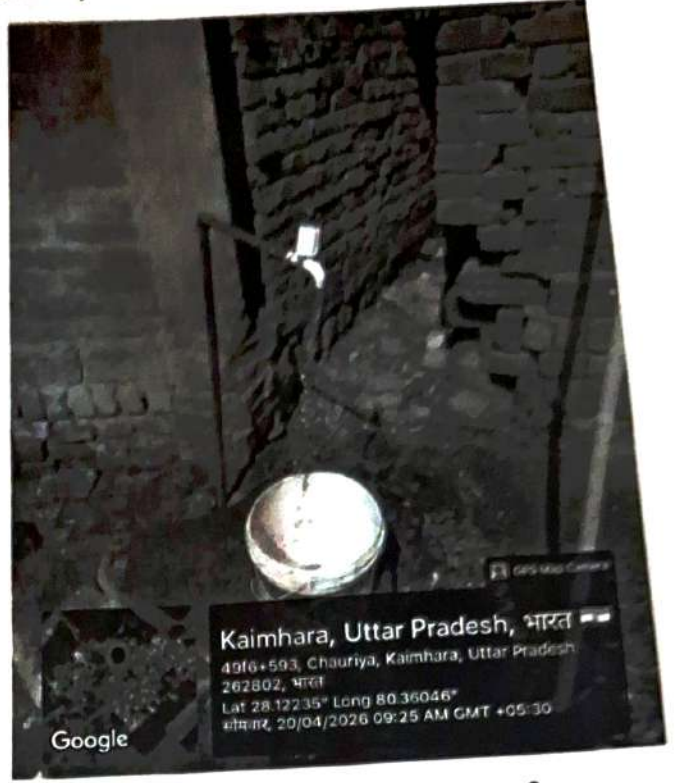

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता ।

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 2- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 3- श्री प्रियांशू यादव, डी०पी०एम०, मै० वी०टी०एल-गाजा (जे०वी०) लखीमपुर खीरी।
- 4- गार्ड फाइल।

अधिशायी अभियन्ता ।



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक

1778

/ M-48

/ 64

दिनांक-22/04/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 21.05.2026 को प्रकाशित खबर "चौरिया गांव में जल जीवन मिशन की टंकी:कई महीनों से पानी सप्लाई ठप, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 21.05.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-बांकेगंज "चौरिया गांव में जल जीवन मिशन की टंकी : कई महीनों से पानी सप्लाई ठप, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतुष्ट किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1097 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-बांकेगंज की ग्राम पंचायत बाबरपुर चौरिया पाइप पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति बाधित की खबर प्रकाशित हुई। बाबरपुर चौरिया पेयजल योजना का कार्य एजेंसी मैसर्स वी०टी०एल-गाजा लि० नोएडा द्वारा कराया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि बाबरपुर के कुछ कनेक्शनों में लो वाटर प्रेशर की समस्या होने के कारण जलापूर्ति बाधित है शेष कनेक्शनों में जलापूर्ति चालू है। उक्त एजेंसी को समस्या के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 दिवस में उक्त कार्य की मरम्मत हेतु टीम लगवा दी जायेगी।
